


V Praze dne 20. května 2025


Zpráva o průběhu 13. hodnotící mise do dolu Turów dne 14. května 2025

1. V souladu s čl. 3, odst. 4. „Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky“ (dále jen Dohody) provedla Česká geologická služba (ČGS) dne 14. května 2025 misi do dolu Turów PGE GiEK S.A. za účasti zástupců dolu a Państwowy Instytut Geologiczny (PIG, Státní geologický ústav).
2. Po přivítání účastníků mise z polské a české strany proběhlo školení bezpečnosti pohybu v prostoru dolu.
3. Účastníci mise se rozdělili na dvě skupiny, jedna se vydala na prohlídku dohodnutých pěti etáží v j. části dolu v blízkosti českého území a provedení hydrologických měření odtékající vody na těchto etážích a druhá skupina absolvovala prezentaci o vývoji hladin podzemní vody v prostoru podzemní stěny.
4. Prezentace o vývoji hladin podzemní vody se týkala vrtů HPp-29/49,5; HPp-23/56; HS-350 a HPp-27/51bis na nátokové straně podzemní stěny, které jsou uvedeny v Dohodě k posuzování k funkčnosti podzemní těsnicí stěny. Obrázek 1 dokumentuje vývoj hladiny podzemní vody mezi dubnem 2022 a dubnem 2025 ve výše uvedených monitorovacích vrtech.

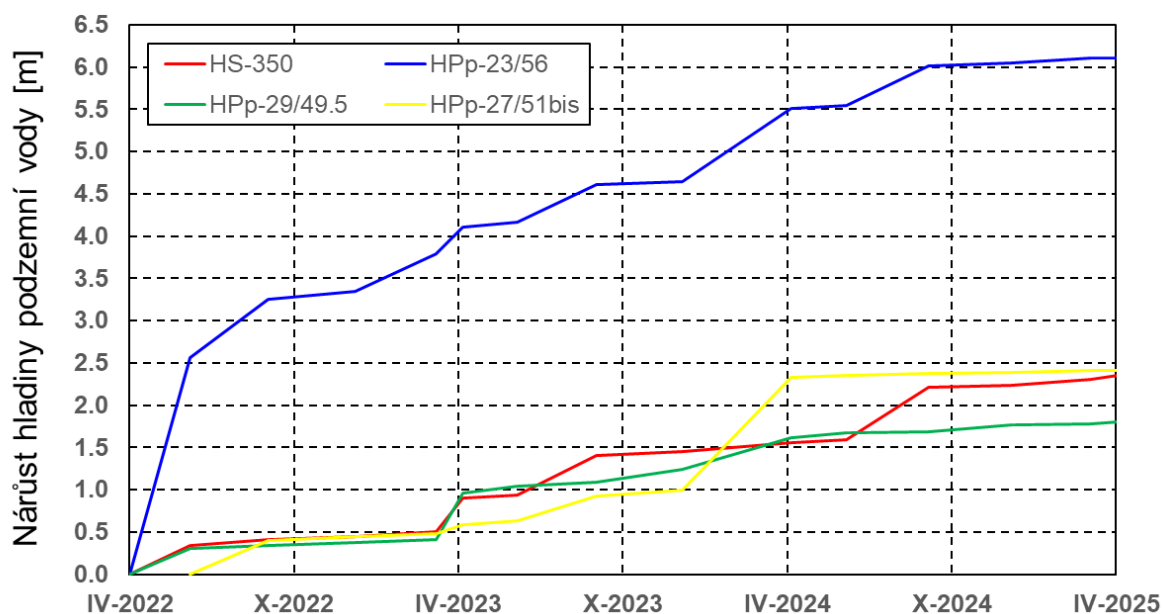

Obr. 1. Vývoj hladiny podzemní vody na pozorovacích vrtech na nátokové straně podzemní stěny dle Dohody

5. Při terénní prohlídce j. stěny dolu byla provedena hydrologická měření odtékající vody (Obr. 2, Tab. 1).

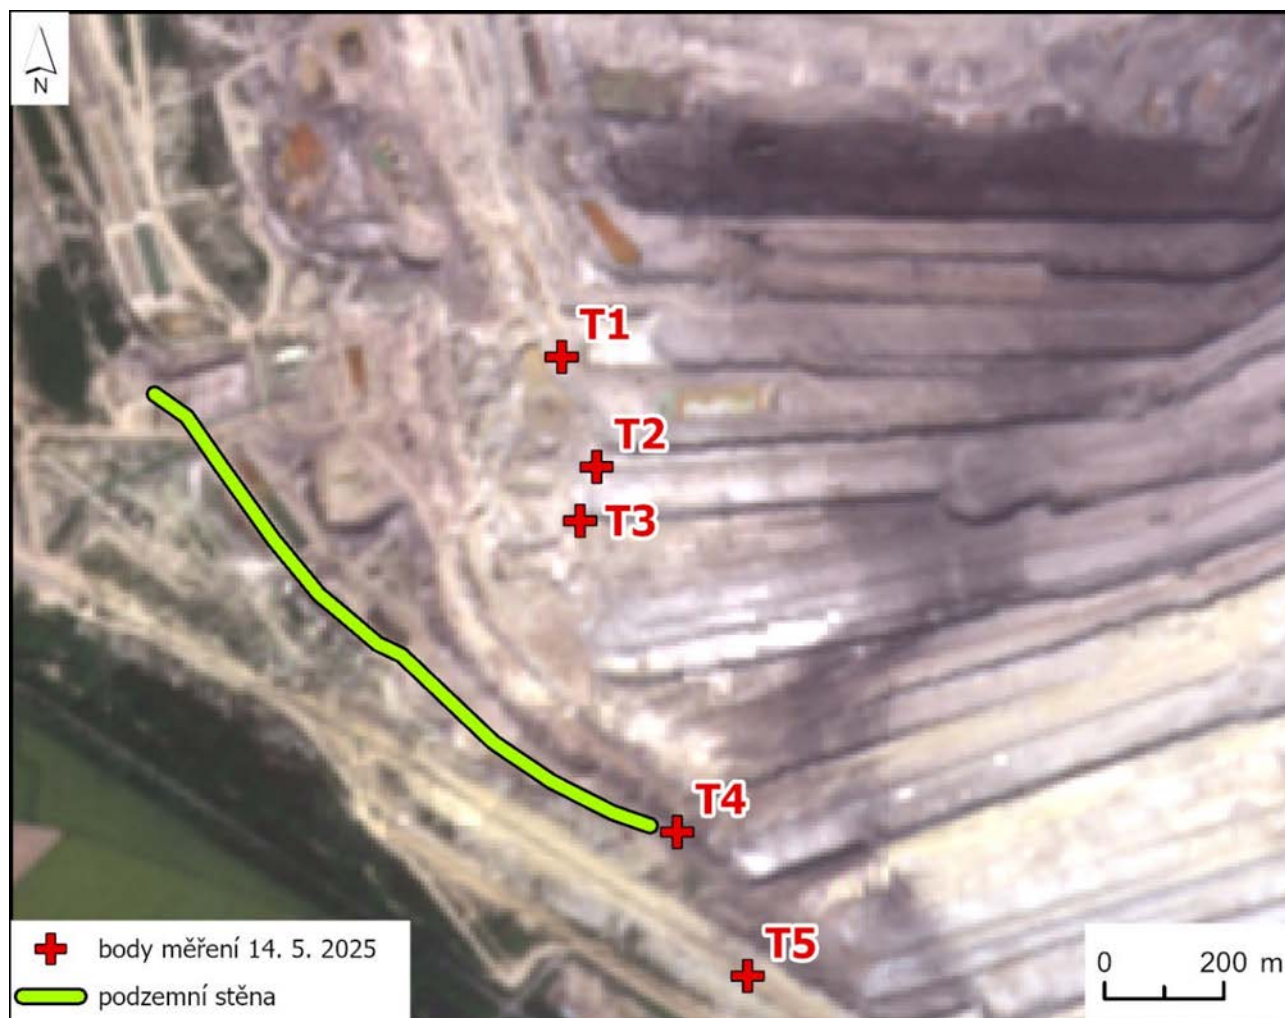

Obr. 2. Situace míst s realizovanými hydrologickými měřeními 14.5.2025 na snímku družice Sentinel 2.


6. Hydrologická měření ČGS se prováděla hydrometrickým křídlem OTT C2. Na každém monitorovacím bodu provedl stejná měření stejným druhem přístroje i Państwowy Instytut Geologiczny. Tabulka č. 1 obsahuje údaje o množství odtékající vody z navštívených etáží v jižní stěně dolu Turów ze dne 14.5. 2025.

Tab. 1. Průtoky ze dne 14.5. 2025

Monitor. bod	průtok (l/s)
T5	6,91
T4	8,17*
T3	2,04
T2	20,22*
T1	15,63

Vysvětlivky: * - měřeno do nádoby o objemu 90 l

7. Obrázek č. 3 dokumentuje stav těžby dolu Turów v jihovýchodním cípu na satelitním snímku družice Sentinel-2 z 5/2025, z něhož je zřejmé, že těžba nepřekročila linii bodů A1 až A4 dle čl. 3, bodu 2 Dohody.

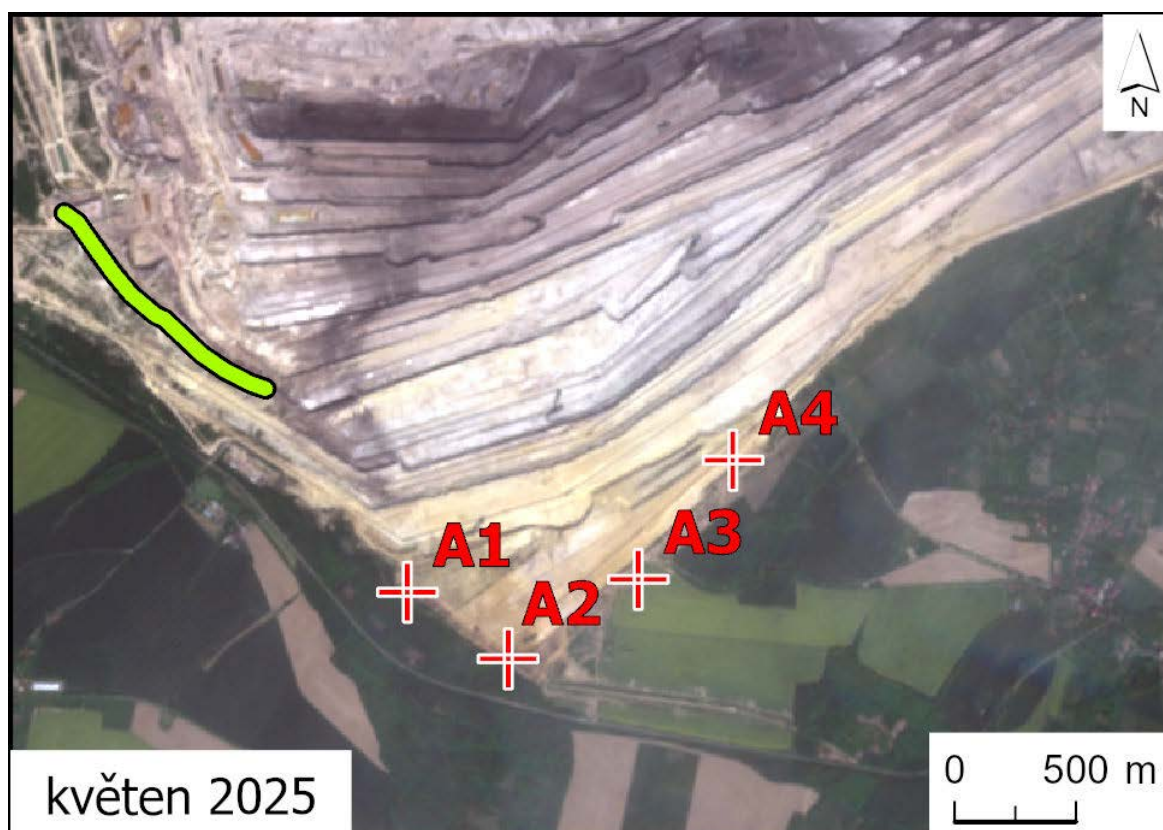

Obr. 3. Snímek družice Sentinel-2 ze dne 14.5.2025 s limitními body (A1-A4) omezujícími těžbu dle Dohody

8. Další hodnotící mise do dolu Turów je předběžně domluvena na 3.9.2025.

Účastníci za českou stranu:

Česká geologická služba:

Mgr. Jan Bohadlo – geolog

Mgr. Kateřina Fárová – DPZ

Ing. Petr Charvát – hydrolog, úřední měřič

RNDr. Renáta Kadlecová – hydrogeolog

Mgr. Ondřej Nol – hydrogeolog

Mgr. Tomáš Vránek – hydrolog, úřední měřič

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. – ředitel

Seznam všech účastníků 13. mise do dolu je uložen na ředitelství dolu Turów.

Zapsala: RNDr. Renáta Kadlecová

Schválil: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.
